



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

PROYECTO ALTO PIURA

**ABRIL 2013
INFORME DE GESTIÓN**



PRESIDENCIA REGIONAL

Lic. Adm. Javier Atkins Lerggios
Presidente Regional de Piura

ALTA DIRECCIÓN

Ing. Pedro Mendoza Guerrero
Gerente General del Proyecto Alto Piura

DIRECTIVOS DEL PROYECTO ALTO PIURA

Lic. Adm. Pilar Núñez Tello (encargada)
Gerencia de Planificación y Presupuesto

Lic. Adm. Pilar Núñez Tello
Gerente de Administración

Abog. Juny Gabriel Castillo Alvarado
Gerente de Asesoría Legal

Ing. Gerardo Acuña Lara
Gerente de Desarrollo Agrícola y Promoción
de la Inversión Privada

Ing. Walter Rojas Zapata
Gerente de Infraestructura

CONSEJO DIRECTIVO

Ing. Reynaldo Hilbck Guzmán
Presidente del Directorio del Proyecto
Alto Piura

Sr. Pablo Guido Raffo Varona
Director Honorario
(Fallecido septiembre 2012)

Dr. Luis Enrique García Barreto
Representante del Gobierno Regional
de Piura

Sr. Juan Alberto Chinchay Cruz
Presidente de la Junta de Usuarios
Huancabamba

Sr. César Teddy Ubillús Olemar
Presidente de la Junta de Usuarios
Chulucanas

Ing. José Maticorena Calle
Colegio de Ingenieros - sede
Chulucanas

PRESENTACIÓN

El Proyecto Alto Piura, es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional Piura, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con personería jurídica, con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende administrativamente, técnico y jerárquica de la Presidencia Regional.

La jurisdicción del Proyecto Alto Piura, comprende el ámbito territorial del área de su influencia directa e indirecta y está constituida por las cuencas hidrográficas de los ríos Huancabamba y Piura, así como de sus afluentes, específicamente los distritos de las provincias de Huancabamba y Morropón, además del distrito de frías de la provincia de Ayabaca, por formar parte de la cuenca del río Piura.

Tiene por finalidad impulsar el desarrollo socioeconómico integral en el ámbito de su jurisdicción contribuyendo al mejoramiento de los niveles de vida de la región y del país, en armonía con el medio ambiente y sus recursos naturales.

I. EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO ALTO PIURA – G. DE INFRAESTRUCTURA

El Proyecto Alto Piura es un Proyecto de Desarrollo Económico-Social, Público-Privado, que comprende la ejecución de cuatro componentes:

COMPONENTES DEL PROYECTO ALTO PIURA

COMPONENTE I:

Presa Tronera Sur y Túnel Traslase (Toma de agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino).

COMPONENTE II:

- (a) *Traslase de agua de cuenca del río Samaniego al río Huancabamba.*
- (b) *Traslase de agua de salida del Túnel Trasandino hasta reservorio Río Seco.*
- (c) *Reservorio Tronera Norte.*
- (d) *Reservorio Río Seco e infraestructura Hídrica para Irrigación del Valle Nuevo.*

COMPONENTE III:

Generación Hidroeléctrica 300+MW e integración al Sistema Interconectado.

COMPONENTE IV:

Sistema de Irrigación para el Valle tradicional utilizando aguas subterráneas y superficiales.

Valor actualizado del componente I

El valor actualizado del Componente I “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino”, asciende a **S/. 565, 988,889**.

COMPONENTE I: Presa Tronera Sur y Túnel Traslase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino)		VALOR
CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E CAMARGO CORREA S.A		522,335,341
CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA		29,424,971
CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (Diseños Definitivos)		14,228,577
SUB TOTAL (S/.)		565,988,889

**COMPONENTE I:
Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de agua del río Huancabamba y túnel trasandino)**

1.1 Ejecución física acumulada 2010 – a abril de 2013

- Desde el punto de vista de ejecución física acumulada

Se tiene que la **Ejecución Física Acumulada** a abril de 2013 es:

AVANCE DE TRABAJOS CONTRATO PRINCIPAL	2010	2011	2012	A ABRIL 2013	ACUMULADO REAL TOTAL
Obras preliminares	21.06%	21.12%	14.45%	4.66%	61.29%
Accesos	11.36%	28.93%	33.14%	11.98%	85.41%
Presa tronera sur	0.00%	0.00%	0.23%	0.00%	0.23%
Túnel de trasvase	0.00%	0.00%	0.12%	1.18%	1.30%
Plan de gestión ambiental	7.09%	27.78%	16.19%	5.57%	56.63%
Avance	5.03%	8.13%	9.91%	4.41%	27.48%

II. DESARROLLO AGRÍCOLA Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Se tuvieron diversas actividades:

- Reunión con representantes del MINAG, AAA, ANA, GRP, Junta de Usuarios del Alto Piura, Junta de Usuarios de Huancabamba, con miras a la ejecución del cuarto y quinto componente del Proyecto Alto Piura.
- Reunión y visita a seis pozos de agua de los distritos de la Matanza y Chulucanas, con la empresa Cenergia, para evaluar uso de energías renovables.
- Inspección en la zona de entrada del Túnel Trasandino con el perito designado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, para que valué el área a expropiar.
- Inspección por parte de la Autoridad Local del Agua del Alto Piura – Huancabamba (ALA) a la cantera de roca Cashapite 1 y a la cantera de agregados Saona, en el sector de Tunas – Huarmaca, con el objetivo de brindar el permiso para la explotación.
- Reuniones de coordinación en el campamento el Palto con CCCC, CSAP y representante de la Gerencia de Infraestructura, realizada el 1 y 23 de abril, donde se revisó cumplimiento de actas, así como se tomaron nuevos acuerdos relacionados con las actividades de liberación de áreas para DMEs, cortes de talud, canteras y pases de agua.
- Reunión con el área de Relaciones Comunitarias de Camargo Correa donde se acordó que las visitas a la población del ámbito del Proyecto para la difusión de bondades se programarán trimestralmente y en forma conjunta con el PEIHAP.
- Reunión con la Gerencia General del Gobierno Regional Piura para sustentar la ampliación de plazas, así como con la Subgerencia de Planificación del GORE para sustentar los tres nuevos componentes del Proyecto y los estudios necesarios relacionados con la sostenibilidad del Proyecto Alto Piura.
- Inspección en el sector Alto El Gallo del potrero II de la noria Ancajima, sobre la supuesta apertura de dos puertas en el cerco perimétrico por parte de la comunidad José Ignacio Távara Pasapera, que viene causando perjuicio a la Asociación de Pequeños Ganaderos Vivientes de los potrero I y II de la Noria Ancajima.
- Inspección en el potrero I de la noria Ancajima sobre el supuesto encerrado de un área aproximada de 300 metros por parte del señor Jacinto Ancajima Maza, en la tierras que estarían arrendadas a la Asociación de Pequeños Ganaderos Vivientes de los potrero I y II de la noria Ancajima.
- Reunión de la mesa técnica de la Cadena Productiva de Aguaymanto, con la participación de representantes de la Municipalidad de Sondorillo, Sierra

Exportadora, FONCODES, ONG SOLCODE, Proyecto Alto Piura, para elaborar plan de trabajo de la mesa técnica.

- Participación en reunión para validación de los criterios técnicos para delimitación de las cabeceras de cuenca.
- Reunión con técnicos del Proyecto Chira – Piura, donde también participo la G. de Infraestructura, para solicitar información de estudios que sirvan para el cuarto y quinto componente del Proyecto.

III. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

3.1. Ejecución financiera acumulada 2010 – a abril de 2013

- Desde el punto de vista de ejecución financiera acumulada

En lo que respecta a la ejecución acumulada del Componente I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino), durante los años 2010 – al 30 de abril de 2013, asciende a **S/. S/. 268, 114,551** tal como se detalla a continuación:

COMPONENTE I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino (incluye vías de acceso)	MONTO CONTRACTUAL Y OTRAS OBLIGACIONES	EJECUCIÓN ACUMULADA 2010-2013	NIVEL DE EJECUCIÓN %
CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E CAMARGO CORREA S.A	522,335,341	238,113,234	45.6%
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC. PER/09/69629/1189-1 - Año 2009 Según Monto Contractual	479,663,437	170,506,022	
ADICIONALES DE OBRA A CONTRATO (07 Adicionales de Obra)	64,657,302	42,477,697	
DEDUCTIVOS DE OBRA A CONTRATO (05 Deductivos de Obra)	- 47,114,913		
Intereses Legales	128,492	128,492	
Laudo Arbitral de derecho de los casos N° 2051-078-2011 y N° 2264-2012-CCL	25,001,023	25,001,023	
CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA	29,424,971	20,938,217	71.2%
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC. PER/09/69629/1190 - Año 2009 Según Monto Contractual	29,424,971	20,938,217	
CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (DISEÑOS DEFINITIVOS)	14,228,577	9,063,101	63.7%
CONCURSO PÚBLICO N° 001- 2011/GRP/PEIHAP (Monto Adjudicado)	14,228,577	9,063,101	
INVERSIÓN TOTAL (S/.)	565,988,889	268,114,551	47.37%

Al 30.04.2013

En resumen, respecto al total de inversión programada, el nivel de ejecución financiera acumulada durante los últimos 3 años es de 47.37%.

RESUMEN TOTAL COMPONENTE I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino (incluye vías de acceso)	Total Inversión I Componente	565,988,889
	Ejecución Acumulada 2010 - Abril 2013	268,114,551
	Pendiente de Ejecución	297,874,338
	Nivel de Ejecución Acumulada	47.37%

3.2. Presupuesto y Ejecución Año Fiscal 2013 - Proyecto Alto Piura:

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) / Presupuesto Institucional Modificado (PIM) / Ejecución del Presupuesto Institucional

Al inicio del año 2013 el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) total de la Institución ascendió a S/. 95, 138, 262, por toda fuente de financiamiento. Al 30 de abril de 2013 se incrementó en S/. 519,428.

Al 30 de abril de 2013, se reporta una ejecución acumulada por el orden de los S/. 17, 030, 830

Presupuesto Institucional - Año 2013 Proyecto Especial Alto Piura	PIA	95,138,262
	PIM	95,657,690
	Ejecución	17,030,830
	Saldo Presupuestal	78, 626, 860
	Nivel de Ejecución (Ejecución/PIM)	17.80%

Fuente: SIAF Presupuesto, Al 30.04.2013

Tal como ya se indica en párrafos precedentes, al 30 de abril de 2013, la ejecución respecto al PIM, está por el orden de los S/. 17, 030, 830 que representa un nivel de ejecución financiera del 17.80% con respecto al PIM del PEIHAP para el año 2013.

3.3. Ejecución presupuestal acumulada (a nivel de Unidad Ejecutora)

RUBRO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %	SALDO
0001 Construcción de Sistema de Riego	87,916,210	82,368,930	13,603,872	16.52%	68,765,058
0002 Elaboración de Estudios Definitivos	255,000	255,000	0	0.00%	255,000
0003 Supervisión y Control	1,109,456	6,973,973	2,218,912	31.82%	4,755,061
0004 Acciones Administrativas	3,839,823	3,983,168	926,510	23.26%	3,056,658
0005 Promoción de la Inversión Privada	30,720	30,720	0	0.00%	30,720
0006 Acciones de Responsabilidad Social y Ambiental	118,775	190,746	82,794	43.41%	107,952
0007 Elaboración de Expedientes Técnicos, Acciones, Supervisión y Control	207,170	207,170	23,725	11.45%	183,445
0008 Elaboración de Estudios (Estudio de Sostenibilidad)	719,334	719,334	0	0.00%	719,334
0009 Elaboración de Catastro	708,110	156,138	0	0.00%	156,138
0010 Saneamiento Físico Legal	233,664	552,011	95,417	17.29%	456,594
0011 Elaboración de Estudios de Pre inversión	0	220,500	79,600	36.10%	140,900
TOTAL	95,138,262	95,657,690	17,030,830	17.80%	78,626,860

Fuente: SIAF Presupuesto, Al 30.04.2013

3.4 Otras actividades

1.- Informes Semanales de las actividades de la Gerencia de Planificación:

Se presentan informes semanales correspondientes a la Gerencia de Planificación, con información actualizada a la fecha de presentación.

2.- Formulación del Presupuesto Multianual 2014-2016 y formulación del POI 2014

En el marco de la Directiva N° 002-2013-EF/50.01, la cual regula la programación y formulación anual - con una perspectiva multianual, se ha dado inicio a la Formulación del Presupuesto Multianual 2014-2016 del PEIHAP; dicho proceso va a ir acompañado de la formulación del POI 2014 del PEIHAP, basados en la Directiva N° 019-2012/GRP-410100 emitida por el Gobierno Regional Piura.

3.- Las Gerencias de Planificación y Presupuesto y Desarrollo Agrícola, participaron en el taller “Programación de Modelo de Intervención para el Desarrollo Territorial Rural en la Zona Andina de Piura”

El taller tiene como objetivo mejorar los niveles de desarrollo de la Región, en particular en la zona rural, para lo cual el Gobierno Regional de Piura se encuentra diseñando un modelo de intervención para el desarrollo rural, el cual es considerado como un piloto a nivel nacional y tendrá una implementación inicial en 8 distritos de la sierra piurana.

En lo que respecta a la Unidad Formuladora se informa lo siguiente:

- Proyecto de Inversión Pública: Mejoramiento del Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa Cashapite.

El consultor presentó el estudio de preinversión. Con Informe de la Unidad Formuladora se devolvió toda la información al contratista y se le otorgó un plazo de diez días calendario a partir de la recepción de la comunicación, para la subsanación conforme estipula el Art. 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El consultor presentó el estudio de preinversión con las observaciones levantadas. Se revisó el estudio de pre inversión y se determinó que el sub capítulo 4.5 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ha sido elaborado sin considerar los lineamientos contemplados en el Anexo SNIP 05 A, por lo que sugirió devolver al consultor a fin de que mejore dicho subcapítulo.

- Proyecto de Inversión Pública: Provisión de los servicios de apoyo a la cadena productiva de Bambú

Se elaboró el informe técnico sobre la revisión al avance del diagnóstico del consultor de Sierra Exportadora, para la formulación del PIP “Provisión de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva de Bambú” y se determinó que es necesario mejorar la información con datos primarios.


Se desarrolló una reunión de trabajo con Sierra Exportadora sede Piura para evaluar el avance del estudio e implementar estrategias para continuar con el estudio de pre inversión.

IV. ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN – ADMINISTRACIÓN

El Proyecto Alto Piura es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional Piura, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con personería jurídica, con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende administrativamente, técnico y jerárquica de la Presidencia Regional.

2.1 Estructura Orgánica del Proyecto Alto Piura

A continuación se presenta el organigrama institucional:

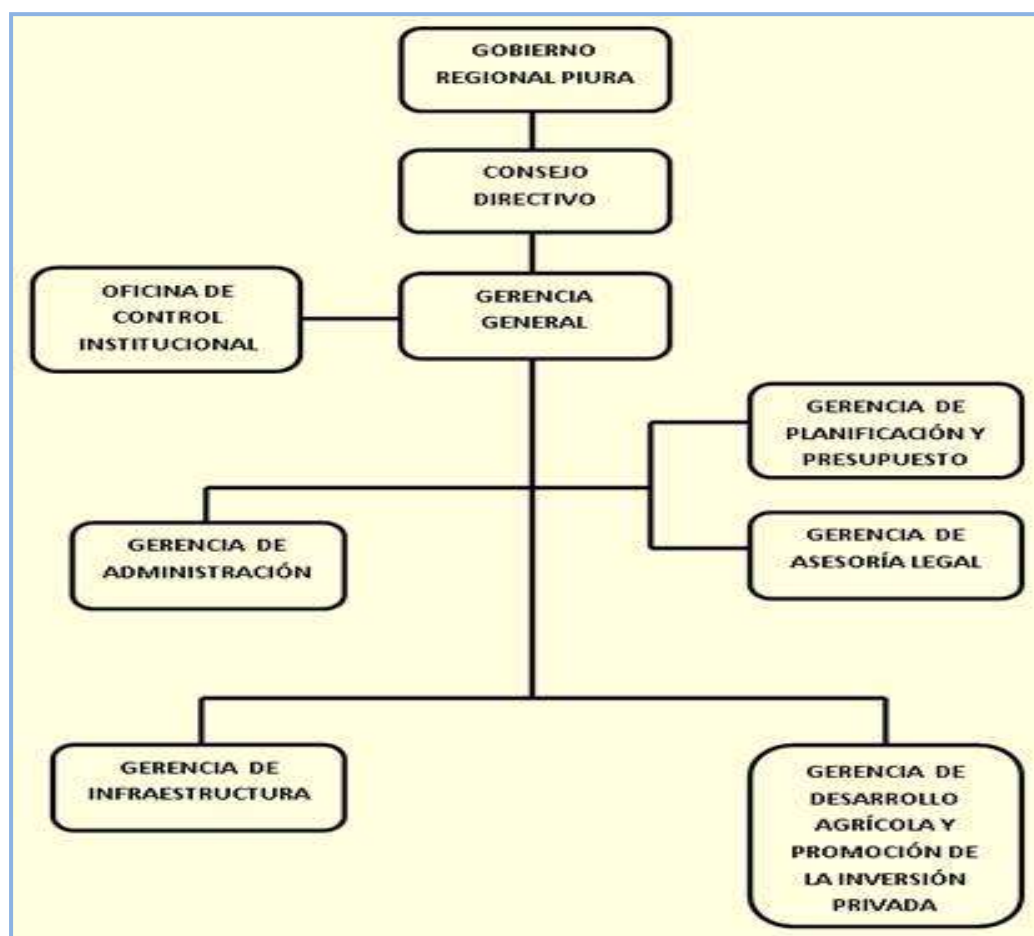


2.2 Recursos Humanos del Proyecto Alto Piura

Los recursos humanos, mejor expresados como potencial humano, constituyen en el Proyecto del Alto Piura el factor principal e indispensable para prestar servicios de calidad y lograr las metas y objetivos fijados.

El Proyecto Alto Piura, por su naturaleza temporal, suscribe con su personal contratos bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada - Decreto Legislativo N° 728.

Actualmente, el recurso humano del Proyecto Alto Piura asciende a 44 personas, de los cuales 39 trabajadores asumen funciones de acuerdo a la estructura de cargos debidamente aprobada y cinco son miembros del Directorio.

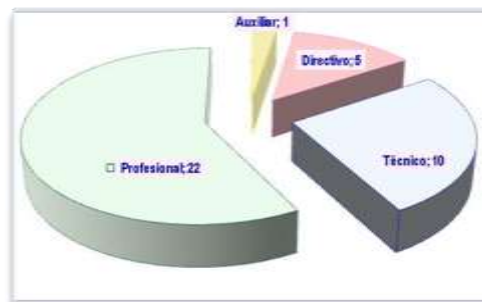

Asimismo, eventualmente cuando existe la necesidad de realizar otro tipo de labores, no contempladas dentro de las funciones, según el Manual de Operaciones, se recurre a la contratación de locación de servicios, algunos de los cuales son profesionales que desarrollan tareas externas específicas y/o consultorías requeridas por el Proyecto.

De los 39 trabajadores, tenemos que 5 son directivos, 23 profesionales, 10 técnicos y 1 auxiliar. La distribución se realiza en todas las áreas orgánicas de la institución.

V IMAGEN INSTITUCIONAL

1. DIFUSIÓN

- Se elaboraron y difundieron notas de prensa sobre los avances del proyecto de bambú y mesa técnica del aguaymanto.
- Se coordinó la difusión sobre el anuncio de la llegada de la misión del Minag y visita de campo realizada en el Alto Piura.
- Se coordinó cobertura y difusión de actividades del presidente regional con la misión del Minag en Piura, el día 17 de abril.
- Se coordinó cobertura y difusión de actividades del presidente regional durante la visita del ministro de Agricultura, el día 26 de abril.
- Se envió información para revista Piura 2013.
- Coordinación con los encargados de las páginas web del Proyecto y de la Región Piura para la actualización correspondiente.
- Se preparó material de difusión del proyecto con la encargada del boletín elaborado por el Gobierno Regional.
- Actualización del periódico mural de la institución.
- Se coordinó con los medios de comunicación y la oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional la entrega de material informativo de acuerdo con el requerimiento de diferentes medios de comunicación o publicaciones institucionales.

2. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES

- Coordinación y participación en visita de campo del Minag, el día 16 de abril.
- Participación y apoyo en mesa de trabajo del Minag.
- Coordinación y participación en visita del ministro de Agricultura.
- Reunión de trabajo convocada por la oficina de Imagen Institucional el día 30 de mayo, con todos los comunicadores del Gobierno Regional.

3. RELACIONES PÚBLICAS

- Se difundió informe mensual entre principales autoridades de la región y se publicó en la página web de la institución.
- Se coordinó la preparación de la exposición fotográfica del Proyecto Alto Piura con Open Plaza, Municipalidades de Piura y Castilla y proveedores.
- Se realizó una reunión de confraternidad por el Día del Trabajo.
- Se coordinó la preparación de información con las distintas gerencias para la consolidación del informe mensual del Proyecto Alto Piura y otros solicitados por las diferentes áreas del Gore, así como organismos públicos.

VI PRINCIPALES LOGROS A ABRIL DE 2013

1.- Se culminaron los trabajos de excavación subterránea de la galería de acceso al túnel Trasandino, llegando al km 0+193.92, intersección con el eje del túnel (203 metros de galería)

En fecha 30 de abril se comunicó a la Supervisión de obra y contratista, la aprobación del calendario de avance de obra valorizado y PERT CPM actualizado con ampliaciones de plazo N° 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13, prestaciones adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y deductivos vinculantes N° 1, 2, 3, 4 y 5, que lleva la fecha de término de la obra al 4 de mayo de 2016.

La Contratista entregó a la Supervisión de Obra el expediente conforme a obra de la subestación Pampas de 1.5 MVA de 22.9/10 KV, ubicado en la plataforma de servicios de la galería de acceso al Túnel Trasandino, que dotará de energía a la infraestructura de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino, dando por culminados estos trabajos.

2.- Se logró un avance físico acumulado de la obra de 27.48%

En el frente Oriente:

Tramo Pampas – Ventana 1, se continúa con obras de arte, protección de talud con gaviones en el patio de maniobras, mantenimiento de caminos, y principalmente se culminaron los trabajos de excavación subterránea de la galería de acceso, llegando al Km 0+192.03 con roca tipo V.

En el frente Occidente:

Tramo Chamelico – Tunas, se continúan los trabajos de movimiento de tierras: nivelación y conformación de capa de sub rasante, colocación de afirmado, mantenimiento de vías de acceso y obras de arte.

Tramo Tunas – Ventana 2, se continúan trabajos de movimiento de tierras: perforación y voladura en vía de acceso y acceso a cantera, relleno para plataforma del campamento Tunas. En el portal de salida se colocan pernos, malla y shocrete, también se prepara material de agregados en canteras Cashapite y Saona, y se realizan trabajos en subestación del portal de salida.

2.- Compromiso del MINAG – ANA – AAA de trabajar en forma conjunta con el GRP y el Proyecto Alto Piura el cuarto y quinto componente

En reunión desarrollada en el GRP con representantes del MINAG, AAA, ANA, Junta de Usuarios del Alto Piura, Junta de Usuarios de Huancabamba, y Proyecto Alto Piura, se levantó acta de compromiso para elaborar términos de referencia para estudios, con miras a la ejecución del cuarto y quinto componente del Proyecto Alto Piura.

3.- Elaboración del plan de trabajo de la Mesa Técnica de la Cadena Productiva del Aguaymanto, del distrito de Sondorillo

La mesa técnica para promover la cadena productiva del aguaymanto en Sondorillo, elaboró plan de trabajo, con la participación de la Municipalidad de Sondorillo, Sierra Exportadora, Foncodes, ONG Solcode y Proyecto Alto Piura.

4.- Se logró un avance financiero acumulado de 47.37%

En lo que respecta a la ejecución acumulada del Componente I: Presa Tronera Sur y Túnel Traslase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasadino), durante los años 2010 – al 30 de abril de 2013, asciende a **S/. S/. 268, 114,551.**

Panel Fotográfico

GALERÍA DE ENTRADA DEL TÚNEL TRASANDINO



FINAL DE LA EXCAVACION SUBTERRANEA DE LA GALERÍA DE ACCESO



TRABAJOS EN GALERÍA



EQUIPO TOPOGRAFICO EMPLANTILLANDO LOS NIVELES PARA LA CIMENTACION DEL PISO DE LA GALERIA



Portal de salida

VISITA DE LA MISIÓN ALTO PIURA DEL MINAG

