



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

PROYECTO ALTO PIURA

ENERO 2013

INFORME DE GESTIÓN



PRESIDENCIA REGIONAL

Lic. Adm. Javier Atkins Lerggios
Presidente Regional de Piura

ALTA DIRECCIÓN

Ing. Pedro Mendoza Guerrero
Gerente General del Proyecto Alto Piura

DIRECTIVOS DEL PROYECTO ALTO PIURA

Ing. Miguel Ángel Alegría Cárdenas
Gerencia de Planificación y Presupuesto

Lic. Adm. Pilar Nuñez Tello
Gerente de Administración

Abog. Juny Gabriel Castillo Alvarado
Gerente de Asesoría Legal

Ing. Gerardo Acuña Lara
Gerente de Desarrollo Agrícola y Promoción
de la Inversión Privada

Ing. Milagros Rosario Paiva Huayamares
Gerente de Infraestructura (e)

CONSEJO DIRECTIVO

Ing. Reynaldo Hilbck Guzmán
Presidente del Directorio del Proyecto
Alto Piura

Sr. Pablo Guido Raffo Varona
Director Honorario
(Fallecido septiembre 2012)

Dr. Luis Enrique García Barreto
Representante del Gobierno Regional
de Piura

Sr. Juan Alberto Chinchay Cruz
Presidente de la Junta de Usuarios
Huancabamba

Sr. César Teddy Ubillús Olemar
Presidente de la Junta de Usuarios
Chulucanas

Ing. Diómedes Vilela Chávez
Colegio de Ingenieros - sede
Chulucanas

PRESENTACIÓN

El Proyecto Alto Piura, es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional Piura, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con personería jurídica, con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende administrativamente, técnico y jerárquica de la Presidencia Regional.

La jurisdicción del Proyecto Alto Piura, comprende el ámbito territorial del área de su influencia directa e indirecta y que está constituida por las cuencas hidrográficas de los ríos Huancabamba y Piura, así como de sus afluentes, específicamente los distritos de las provincias de Huancabamba y Morropón, además del distrito de frías de la provincia de Ayabaca, por formar parte de la cuenca del río Piura.

Tiene por finalidad impulsar el desarrollo socioeconómico integral en el ámbito de su jurisdicción contribuyendo al mejoramiento de los niveles de vida de la región y del país, en armonía con el medio ambiente y sus recursos naturales.

I. EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO ALTO PIURA

El Proyecto Alto Piura es un Proyecto de Desarrollo Económico-Social, Público-Privado, que comprende la ejecución de cuatro componentes:

COMPONENTES DEL PROYECTO ALTO PIURA

COMPONENTE I:

Presa Tronera Sur y Túnel Traslase (Toma de agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino).

COMPONENTE II:

- (a) *Traslase de agua de cuenca del río Samaniego al río Huancabamba.*
- (b) *Traslase de agua de salida del Túnel Trasandino hasta reservorio Río Seco.*
- (c) *Reservorio Tronera Norte.*
- (d) *Reservorio Río Seco e infraestructura Hídrica para Irrigación del Valle Nuevo.*

COMPONENTE III:

Generación Hidroeléctrica 300+MW e integración al Sistema Interconectado.

COMPONENTE IV:

Sistema de Irrigación para el Valle tradicional utilizando aguas subterráneas y superficiales.

Valor actualizado del componente I

El valor actualizado del Componente I “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino”, asciende a **S/. 565, 988,889**.

COMPONENTE I: Presa Tronera Sur y Túnel Traslase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino)	VALOR
CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E CAMARGO CORREA S.A	522,335,341
CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA	29,424,971
CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (Diseños Definitivos)	14,228,577
SUB TOTAL (S/.)	565,988,889

1/. Al 31.12.2012 se han aprobado 07 Adicionales de Obra y 05 deductivos de obra

**COMPONENTE I:
Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de agua del río Huancabamba y túnel trasandino)**

1.1 Ejecución física acumulada 2010 – enero 2013

- Desde el punto de vista de ejecución física acumulada

Tal como reporta la Gerencia de Infraestructura, se tiene que la **Ejecución Física Acumulada** al 31.01.2013 es como se detalla a continuación:

AVANCE DE TRABAJOS CONTRATO PRINCIPAL	2010	2011	2012	ENERO 2013	ACUMULADO REAL TOTAL
Obras preliminares	21.06%	21.12%	14.45%	1.19%	57.83%
Accesos	11.36%	28.93%	33.14%	3.41%	76.84%
Presa tronera sur	0.00%	0.00%	0.23%	0.00%	0.23%
Túnel de trasvase	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	0.21%
Plan de gestión ambiental	7.09%	27.78%	16.19%	1.79%	52.85%
Avance	5.03%	8.13%	9.91%	1.67%	24.74%

II. DESARROLLO AGRÍCOLA Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

- Se ha concluido con el trabajo de campo del empadronamiento de las familias de Pabur y Vicús del distrito de La Matanza.
- Reunión con el Ing. Manuel Chavez, jefe de FONCODES, e Ing. Álvaro López, gerente de la Subregión Morropón Huancabamba, para coordinar intervención conjunta en la zona de influencia del PEIHAP.
- Pago de compensaciones a afectados por habilitación de Depósito de Materiales de Escombros (DME), cortes de talud por construcción de la carretera Chamelico-Tunas-Ventana 2, así como por los estudio de geofísica para el diseño del Túnel Trasandino.
- Pago de expropiación de área para zona industrial en Pampas- Sondorillo.
- Coordinaciones con Gerencia de Planificación y Presupuesto, representantes de Sierra Exportadora, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y consultores para elaborar el PIP sobre caña Guayaquil (bambú).
- Coordinaciones con el jefe de desarrollo económico de la Municipalidad de Sondorillo, para tratar respecto a la conformación de la Asociación de Productores de aguaymanto, así como la producción de truchas, reforestación y convenio con el PSI.
- Reunión con CCCC y CSAP (comité de responsabilidad social) para revisar propuestas de las consultoras Cussi Consultores y Pacific Latam y revisar la partida de Difusión de Bondades.
- Participación en representación del Proyecto, en el distrito de San Miguel de El Faique en el taller de Fortalecimiento de capacidades para los jóvenes de Huancabamba.
- Participación de personal de la GDA en visitas de campo en el monitoreo participativo de la calidad del agua de la cuenca del río Piura, organizado por la Autoridad Administrativa del Agua (AAA).
- Inspección ocular del perito designado por el Ministerio de Vivienda de la zona de entrada al túnel trasandino y dos (2) áreas más cercanas al cruce de la quebrada Uchupata y río Huancabamba, para expropiación.
- Coordinaciones con la Dirección General de Agricultura (DGA) respecto a documentos necesarios para contar con el permiso para la cantera de liga, así como con la Dirección Regional de Cultura (DRC) para la obtención del certificado CIRA.
- Reuniones de trabajo con CCCC y CSAP, donde se reviso cumplimiento de compromisos y se coordinaron nuevas actividades entre ellas: inspección de la zona Chamelico-Tunas-ventana2 para identificar nuevos DMEs. De otro lado se coordinó con propietarios de nuevas áreas para liberaciones.

III. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

3.1. Ejecución financiera acumulada 2010 – enero 2013

- Desde el punto de vista de ejecución financiera acumulada

En lo que respecta a la ejecución acumulada del Componente I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino), durante los años 2010- enero 2013, asciende a **S/. 249, 958, 253**, tal como se detalla a continuación:

COMPONENTE I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino)	INVERSIÓN	EJECUCIÓN ACUMULADA 2010-2012	NIVEL DE EJECUCIÓN (Ejecución / Inversión) %
CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E CAMARGO CORREA S.A	522,335,341	221,621,119	42.4%
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC. 1189-1 - Año 2009	479,663,437	166,603,108.22	
ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA	17,542,389	29,888,495.98	
INTERESE LEGALES	128,492	128,492	
Laudo Arbitral N° 2051-078-2011 y N° 2264-2012-CCL	25,001,023	25,001,023	
CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA	29,424,971	19,274,032.94	65.5%
CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (Diseños Definitivos)	14,228,577	9,063,101	63.7%
SUB TOTAL (S/.)	565,988,889	249,958,253	44.2%

Fuente: SIAF Presupuesto, al 31.12.2012

En resumen, respecto al total de inversión programada, el nivel de ejecución financiera acumulada durante los últimos 3 años está por el orden del 43.8%.

RESUMEN TOTAL COMPONENTE I: Presa Tronera Sur y Túnel Traslase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino)	Total Inversión I Componente	565,988,889
	Ejecución Acumulada 2010-2013	249,958,253
	Pendiente de Ejecución	316,030,636
	Nivel de Ejecución Acumulada	44.2%

Fuente: SIAF Presupuesto, al 31.12.2012

3.2. Presupuesto y Ejecución 2013 - Proyecto Alto Piura:

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) / Presupuesto Institucional Modificado (PIM) / Ejecución del Presupuesto Institucional

El Presupuesto Institucional Modificado asciende a S/. 95, 138, 262, por toda fuente de financiamiento, de los cuales se reporta una ejecución acumulada del orden de **S/. 2, 159, 545.**


Presupuesto Institucional – año 2012 Proyecto Alto Piura	PIM	95,138,262
	Ejecución	2,159,545
	Saldo Presupuestal	92,978,717
	Nivel de Ejecución (Ejecución/ PIM)	2.27%

3.3. Continuidad de las inversiones - año 2013

La continuidad de las inversiones para el año 2013 está garantizada con el presupuesto asignado por el pliego del Gobierno Regional de Piura, tal como se detalla a continuación:


Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2013 - Proyecto Alto Piura:

Para el año fiscal 2013, los recursos asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Proyecto Alto Piura ascienden a un total de S/. 95, 138, 262, por toda fuente de financiamiento.

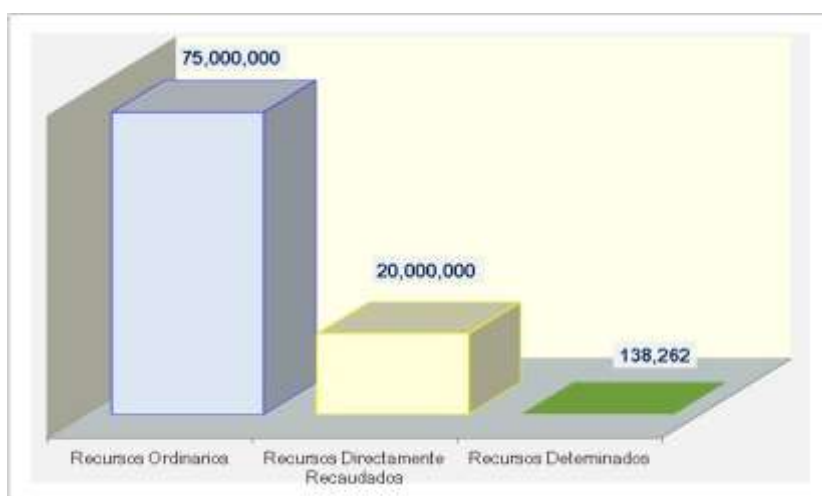

Fuente: SIAF Presupuesto

Con el presupuesto asignado se tiene garantizada la continuidad de la ejecución del Componente I. Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el 94% del total presupuestado está siendo asignado al proyecto "Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura" y únicamente el 6% se orienta a "Gestión de Proyectos":

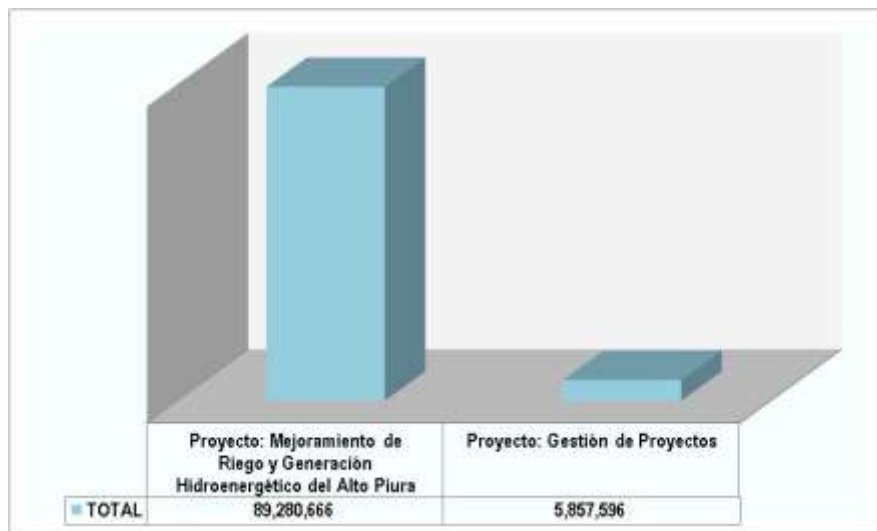

Para mayor precisión se tiene el siguiente detalle:

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) - AÑO FISCAL 2013				
Proyecto/meta presupuestal	Presupuesto Inicial de Apertura – PIA			
	Recursos Ordinarios	Recursos Determinados	Recursos Directamente Recaudados	Total
Proyecto: Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura	75,000,000	14,280,666	0	89,280,666
Proyecto: Gestión de Proyectos	0	5,719,334	138,262	5,857,596
TOTAL	75,000,000	20,000,000	138,262	95,138,262


Fuente: SIAF Presupuesto - Enero 2013

4. ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN - ADMINISTRACIÓN

El Proyecto Alto Piura es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional Piura, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con personería jurídica, con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende administrativamente, técnico y jerárquica de la Presidencia Regional.

2.1 Estructura Orgánica del Proyecto Alto Piura

A continuación se presenta el organigrama institucional:

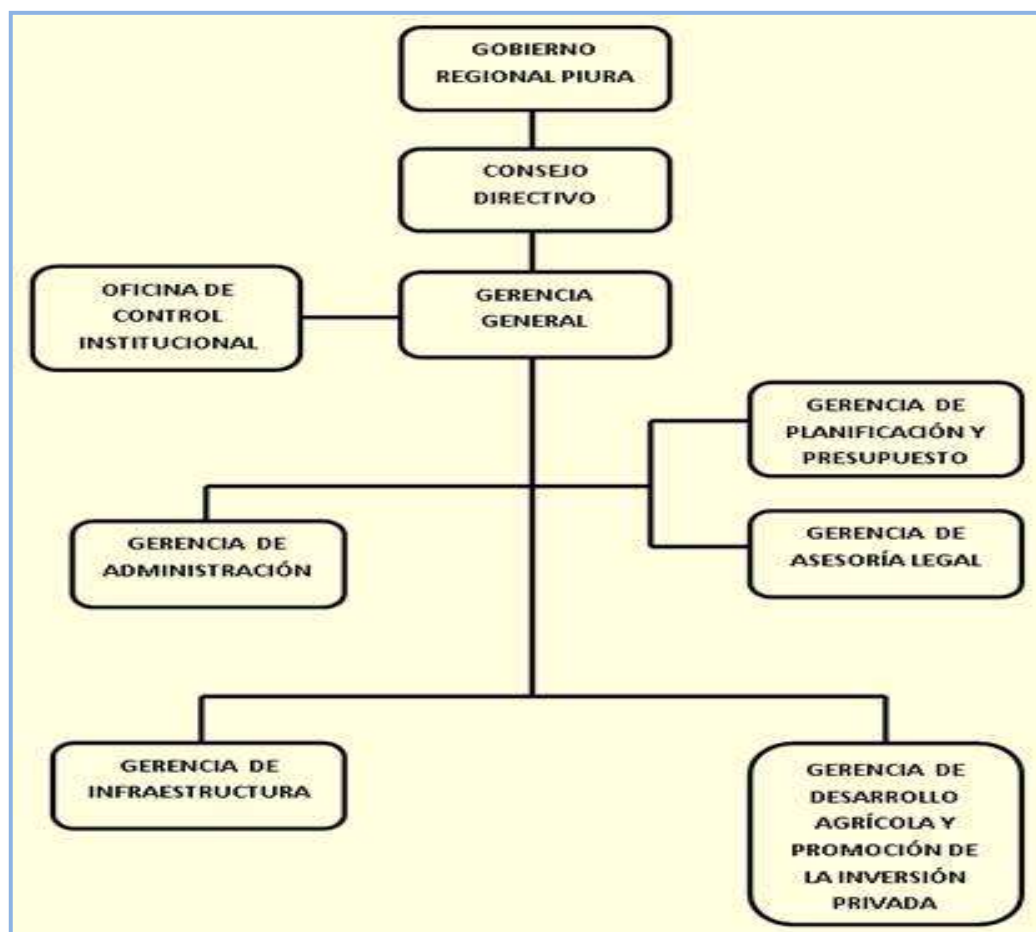


2.2 Recursos Humanos del Proyecto Alto Piura

Los recursos humanos, mejor expresados como potencial humano, constituyen en el Proyecto del Alto Piura el factor principal e indispensable para prestar servicios de calidad y lograr las metas y objetivos fijados.

El Proyecto Alto Piura, por su naturaleza temporal, suscribe con su personal contratos bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada - Decreto Legislativo N° 728.

Actualmente, el recurso humano del Proyecto Alto Piura asciende a 43 personas, de los cuales 38 trabajadores asumen funciones de acuerdo a la estructura de cargos debidamente aprobada y cinco son miembros del Directorio. Asimismo, eventualmente cuando existe la necesidad de realizar otro tipo de labores, no contempladas dentro de las funciones, según el Manual de Operaciones, se recurre a la contratación de locación de servicios, algunos de los cuales son profesionales que desarrollan tareas externas específicas y/o consultorías requeridas por el Proyecto.

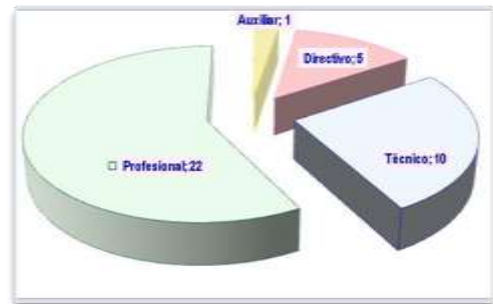

De los 38 trabajadores, tenemos que 5 son directivos, 22 profesionales, 10 técnicos y 1 auxiliar. La distribución se realiza en todas las áreas orgánicas de la institución.

INFORME DE ACTIVIDADES IMAGEN INSTITUCIONAL ENERO 2013

*** DIFUSIÓN**

- Elaboración y difusión de nota de prensa sobre talleres con autoridades.
- Elaboración y difusión de nota de prensa sobre culminación del trabajo de campo del empadronamiento en Pabur y Vicús.
- Elaboración y difusión de nota de prensa sobre visita del embajador de Alemania a obras del Proyecto Alto Piura.
- Elaboración y difusión de nota de prensa sobre encuentro con jóvenes en San Miguel El Faique

- Coordinación con los encargados de las páginas web del Proyecto y de la Región Piura para la actualización correspondiente.
- Se coordina material de difusión del proyecto con la encargada del boletín elaborado por el Gobierno Regional.
- Actualización del periódico mural de la institución.
- Se coordina con los medios de comunicación y la oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional la entrega de material informativo de acuerdo con el requerimiento de diferentes medios de comunicación o publicaciones institucionales.

***PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES**

- Reunión de trabajo con consultor en comunicaciones para entrega final del presupuesto para actividades de Imagen Institucional durante el 2013.
- Coordinación con gerencia de Desarrollo Social del Gore e instancias del Proyecto, para exposición en el marco de actividad con cien jóvenes a realizarse el 26 de enero en San Miguel de El Faique.
- Cobertura de reunión con Sierra Exportadora por cadenas de bambú y aguaymanto.
- Viaje a Pampas (16 y 17 de enero) por visita del embajador de Alemania en Perú.
- Participación en reuniones para elaboración de documentos de gestión.
- Participación en reuniones sobre Responsabilidad Social con la empresa Camargo Correa y directivos del Proyecto.

***MATERIAL PUBLICITARIO**

- Se preparó e imprimió tríptico institucional.
- Se preparó e imprimió calcomanía con el logo del proyecto.4

***RELACIONES PÚBLICAS**

- Carta de saludo institucional por 97 aniversario del diario El Tiempo.
- Carta de saludo institucional por 77 aniversario de la provincia de Morropón – Chulucanas.
- Coordinación de reuniones con directivos del Proyecto y consejeros del Gobierno Regional.

PRINCIPALES LOGROS ENERO DE 2013

1. Se inicio la perforación del túnel trasandino

Se trabaja en el portal de acceso a la galería con actividades de perforación y revestimiento, colocación de elementos de soporte y nivelación de rampa. La galería tiene un avance de 15 m.

2.- Se logró un avance físico acumulado de la obra de 24.74%

Se ejecutan vaciados de losas de concreto y losas para poza de tratamiento en el patio de maniobras. En la Planta industrial se continúa con el ensamblaje de la Chancadora. En el frente Occidente: se continúan trabajos de movimiento de tierras y obras de arte en los tramos Chamelico – Tunal – Portal a Ventana 2.

3.- Se concluyó con el trabajo de campo del empadronamiento de las familias de Pabur y Vicús del distrito de La Matanza.

4.- Se logró un avance físico acumulado de la obra de 44.2%

En lo que respecta a la ejecución acumulada del Componente I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino), durante los años 2010-enero 2013, asciende a **S/. 249, 958, 253.** :

Panel Fotográfico



Galería



Maquinaria empleada para la perforación del túnel



Campamento Pampas



Llenado de canastas tipo CFB (Reforzadas) en la protección de talud en el km 22+500 al 22+550



Plataforma Industrial donde se instalan las plantas de concreto y chancado de agregados y los talleres de metalmecánica y madera



Preparación para el portal de salida
