



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

PROYECTO ALTO PIURA

FEBRERO INFORME DE GESTIÓN



FEBRERO 2013

PRESIDENCIA REGIONAL

Lic. Adm. Javier Atkins Lerggios
Presidente Regional de Piura

ALTA DIRECCIÓN

Ing. Pedro Mendoza Guerrero
Gerente General del Proyecto Alto Piura

DIRECTIVOS DEL PROYECTO ALTO PIURA

Lic. Adm. Pilar Núñez Tello (encargada)
Gerencia de Planificación y Presupuesto

Lic. Adm. Pilar Núñez Tello
Gerente de Administración

Abog. Juny Gabriel Castillo Alvarado
Gerente de Asesoría Legal

Ing. Gerardo Acuña Lara
Gerente de Desarrollo Agrícola y Promoción
de la Inversión Privada

Ing. Walter Rojas Zapata
Gerente de Infraestructura

CONSEJO DIRECTIVO

Ing. Reynaldo Hilbck Guzmán
Presidente del Directorio del Proyecto
Alto Piura

Sr. Pablo Guido Raffo Varona
Director Honorario
(Fallecido septiembre 2012)

Dr. Luis Enrique García Barreto
Representante del Gobierno Regional
de Piura

Sr. Juan Alberto Chinchay Cruz
Presidente de la Junta de Usuarios
Huancabamba

Sr. César Teddy Ubillús Olemar
Presidente de la Junta de Usuarios
Chulucanas

Ing. Diómedes Vilela Chávez
Colegio de Ingenieros - sede
Chulucanas

PRESENTACIÓN

El Proyecto Alto Piura, es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional Piura, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con personería jurídica, con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende administrativamente, técnico y jerárquica de la Presidencia Regional.

La jurisdicción del Proyecto Alto Piura, comprende el ámbito territorial del área de su influencia directa e indirecta y que está constituida por las cuencas hidrográficas de los ríos Huancabamba y Piura, así como de sus afluentes, específicamente los distritos de las provincias de Huancabamba y Morropón, además del distrito de frías de la provincia de Ayabaca, por formar parte de la cuenca del río Piura.

Tiene por finalidad impulsar el desarrollo socioeconómico integral en el ámbito de su jurisdicción contribuyendo al mejoramiento de los niveles de vida de la región y del país, en armonía con el medio ambiente y sus recursos naturales.

I. EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO ALTO PIURA – G. DE INFRAESTRUCTURA

El Proyecto Alto Piura es un Proyecto de Desarrollo Económico-Social, Público-Privado, que comprende la ejecución de cuatro componentes:

COMPONENTES DEL PROYECTO ALTO PIURA

COMPONENTE I:

Presa Tronera Sur y Túnel Traslase (Toma de agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino).

COMPONENTE II:

- (a) *Traslase de agua de cuenca del río Samaniego al río Huancabamba.*
- (b) *Traslase de agua de salida del Túnel Trasandino hasta reservorio Río Seco.*
- (c) *Reservorio Tronera Norte.*
- (d) *Reservorio Río Seco e infraestructura Hídrica para Irrigación del Valle Nuevo.*

COMPONENTE III:

Generación Hidroeléctrica 300+MW e integración al Sistema Interconectado.

COMPONENTE IV:

Sistema de Irrigación para el Valle tradicional utilizando aguas subterráneas y superficiales.

Valor actualizado del componente I

El valor actualizado del Componente I “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino”, asciende a **S/. 565, 988,889**.

COMPONENTE I:	
Presa Tronera Sur y Túnel Traslase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino)	VALOR
CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E CAMARGO CORREA S.A	522,335,341
CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA	29,424,971
CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (Diseños Definitivos)	14,228,577
SUB TOTAL (S/.)	565,988,889

1/. Al 31.12.2012 se han aprobado 7 Adicionales de Obra y 5 deductivos de obra

**COMPONENTE I:
 Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de agua del río Huancabamba y túnel trasandino)**

1.1 Ejecución física acumulada 2010 – febrero 2013

- Desde el punto de vista de ejecución física acumulada

Se tiene que la **Ejecución Física Acumulada** al 28.02.2013 es como se detalla a continuación:

AVANCE DE TRABAJOS CONTRATO PRINCIPAL	2010	2011	2012	A FEBRERO 2013	ACUMULADO REAL TOTAL
Obras preliminares	21.06%	21.12%	14.45%	2.45%	59.08%
Accesos	11.36%	28.93%	33.14%	6.19%	79.63%
Presa tronera sur	0.00%	0.00%	0.23%	0.00%	0.23%
Túnel de trasvase	0.00%	0.00%	0.12%	0.57%	0.69%
Plan de gestión ambiental	7.09%	27.78%	16.19%	3.01%	54.07%
Avance	5.03%	8.13%	9.91%	2.64%	25.71%

II. DESARROLLO AGRÍCOLA Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Se tuvieron diversas actividades:

- Entrega del informe final por parte del proveedor del servicio de empadronamiento de las familias de Pabur y Vicús del distrito de la Matanza.
- Presentación a autoridades y directivos de las Asociaciones de ganaderos de los resultados del empadronamiento de las familias de Pabur y Vicús del distrito de La Matanza.
- Elaboración de propuesta de tres componentes nuevos para el Proyecto siendo estos el quinto componente de forestación y reforestación de las cuencas altas de las áreas de influencia del Proyecto, el sexto de mejoramiento del sistema de irrigación de la cuenca alta de las áreas de influencia del Proyecto Alto Piura, y el séptimo mejoramiento del sistema de riego del valle Alto Piura, mediante reservorios en los afluentes del río Pura.
- Reunión con el subgerente de seguridad ciudadana del GORE, para coordinar el tema de seguridad en obra, asistieron CCCC, CSAP y la G. de Administración.
- Pago de vivienda afectada por la construcción de la carretera Tunas-Ventana 2, así como pago de expropiación en Pampas- Sodorillo.
- Reuniones con consultora del GRP para tratar directiva sobre venta de tierras de proyectos especiales como el Chira-Piura y el PEIHAP.
- Reunión con Camargo Correa, CSAP, así con la G. de Planificación y Presupuesto, G. Infraestructura, G. Administración y G. Desarrollo Agrícola para mejorar el plan de difusión del Proyecto Alto Piura que viene ejecutando CCCC.
- Reunión con representantes de Sierra Exportadora, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, G. de Planificación así como consultores, para conocer avances del PIP sobre caña guayaquil. Asimismo reunión con equipo técnico de la Municipalidad de San Juan de Bigote para acciones conjuntas en favor del proyecto de caña guayaquil.
- Reunión con FONCODES, con quien se acordó establecer un acuerdo de cooperación interinstitucional para desarrollar proyectos productivos en Yamango, Sodorillo y Huarmaca, en cultivos como aguaymanto y caña Guayaquil.
- Reunión con representantes de SENATI zonal Piura - Tumbes, para establecer actividades en el marco del convenio con el Proyecto, el mismo que está en elaboración.

III. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
3.1. Ejecución financiera acumulada 2010 – febrero 2013

- Desde el punto de vista de ejecución financiera acumulada

En lo que respecta a la ejecución acumulada del Componente I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino), durante los años 2010 – febrero de 2013, asciende a **S/. 258, 872,118**, tal como se detalla a continuación:

COMPONENTE I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino (incluye vías de acceso)	MONTO CONTRACTUAL Y OTRAS OBLIGACIONES	EJECUCIÓN ACUMULADA 2010-2013	NIVEL DE EJECUCIÓN %
CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E CAMARGO CORREA S.A	522,335,341	229,980,256	44.0%
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC. PER/09/69629/1189- 1 - Año 2009 Según Monto Contractual	479,663,437	167,787,602	
ADICIONALES DE OBRA A CONTRATO (07 Adicionales de Obra)	64,657,302	37,063,140	
DEDUCTIVOS DE OBRA A CONTRATO (05 Deductivos de Obra)	- 47,114,913		
Intereses Legales (May 2012)	128,492	128,492	
Laudo Arbitral de derecho de los casos N° 2051-078-2011 y N° 2264-2012-CCL	25,001,023	25,001,023	
CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA	29,424,971	19,828,761	67.4%
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC. PER/09/69629/1190 - Año 2009 - Según Monto Contractual	29,424,971	19,828,761	
CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (DISEÑOS DEFINITIVOS)	14,228,577	9,063,101	63.7%
CONCURSO PÚBLICO N° 001- 2011/GRP/PEIHAP (Monto Adjudicado)	14,228,577	9,063,101	
INVERSIÓN TOTAL (S/.)	565,988,889	258,872,118	45.7%

Fuente: SIAF Presupuesto, al 28.02.2013

En resumen, respecto al total de inversión programada, el nivel de ejecución financiera acumulada durante los últimos 3 años es de 45.7%.

RESUMEN TOTAL COMPONENTE I: Presa Tronera Sur y Túnel Traslase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino)	Total Inversión I Componente	565,988,889
	Ejecución Acumulada 2010-2012	258,872,118
	Pendiente de Ejecución	307,116,771
	Nivel de Ejecución Acumulada	45.7%

Fuente: SIAF Presupuesto, al 28.02.2013

3.2. Presupuesto y Ejecución Año Fiscal 2013 - Proyecto Alto Piura:

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) / Presupuesto Institucional Modificado (PIM) / Ejecución del Presupuesto Institucional

Al inicio del año 2013 el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) total de la Institución ascendió a S/. 95, 138, 262, por toda fuente de financiamiento. A la fecha, no se ha registrado ningún incremento al referido presupuesto

Al cierre del mes de febrero 2013, se reporta una ejecución acumulada por el orden de los **S/. 7, 278,476**.

Presupuesto Institucional - Año 2013 Proyecto Especial Alto Piura	PIA	95,138,262
	PIM	95,138,262
	Ejecución	7,278,476
	Saldo Presupuestal	87,859,786
	Nivel de Ejecución (Ejecución/PIM)	7.65%

Fuente: SIAF Presupuesto, al 28.02.2013

Tal como ya se indica en párrafos precedentes, al 28 de febrero de 2013, la ejecución respecto al PIM, es de S/. 7, 278, 476 que representa un nivel de ejecución financiera del 7.65 % con respecto al PIM del PEIHAP para el año 2013.

3.3. Ejecución presupuestal acumulada (a nivel de Unidad Ejecutora)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA A FEBRERO 2013	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE	SALDO
0001 Construcción de Sistema de Riego	87,916,210	87,361,482	5,470,894	6.26%	81,890,588
0002 Elaboración de Estudios Definitivos	255,000	255,000	0	0.00%	255,000
0003 Supervisión y Control	1,109,456	1,664,184	1,109,456	66.67%	554,728
0004 Acciones Administrativas	3,839,823	3,839,823	447,543	11.66%	3,392,280
0005 Promoción de la Inversión Privada	30,720	30,720	0	0.00%	30,720
0006 Acciones de Responsabilidad Social y Ambiental	118,775	180,025	71,823	39.90%	108,202
0007 Elaboración de Expedientes Técnicos, Acciones, Supervisión y Control	207,170	207,170	7,240	3.49%	199,930
0008 Elaboración de Estudios (Estudio de Sostenibilidad)	719,334	697,834	0	0.00%	697,834
0009 Elaboración de Catastro	708,110	156,138	0	0.00%	156,138
0010 Saneamiento Físico Legal	233,664	525,386	91,919	17.50%	433,467
0011 Elaboración de Estudios de Pre inversión	0	220,500	79,600	36.10%	140,900
TOTAL	95,138,262	95,138,262	7,278,476	7.65%	87,859,786
Previsto			8.270.441	11,17	

3.4 Otras actividades

En lo que respecta a la Unidad Formuladora se informa lo siguiente:

VISITA DE CAMPO CON CONSULTOR DE SIERRA EXPORTADORA

Se hizo un recorrido por los distritos de San Juan de Bigote, Canchaque, Lalaquiz y Yamango.

SENSIBILIZACION A LOS PRODUCTORES DE BAMBÚ

Reunión con productores de bambú en la localidad de Barrios a invitación de la Municipalidad Distrital de San Juan de Bigote. Se les explicó en qué consiste el proyecto de apoyo a la cadena productiva de bambú, la necesidad de organizarse formalmente para recibir los beneficios del proyecto, y su compromiso de apoyar en la recopilación de datos. Asistieron productores de Barrios, La Quemazón, La Pareja, Dotor, Cardal y Virgen del Carmen (de Bigote) Cilia y de San Martín de Pajonal (de Canchaque) por ser zonas muy cercanas.

REUNIÓN DE COORDINACION CON FONCODES PIURA

A invitación de FONCODES Piura se asistió a una reunión de trabajo para terminar algunas coincidencias entre los proyectos que ambas instituciones vienen desarrollando en las provincias de Huancabamba y Morropón.

PRESTACIÓN ADICIONAL PARA INCORPORAR NUEVOS CANALES AL PIP MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SUB SECTOR CHALPA CASHAPITE-HUARMACA.


Mediante Informe N° 016-2013/GRP-407000-407400-MVP de fecha 26/02/2013 se sustenta y se recomienda la prestación adicional para incorporar nuevos canales a la formulación del estudio de pre inversión “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa Cashapite en el distrito de Huarmaca, en la provincia de Huancabamba – Piura”, a cargo del consultor Juan Estuardo Chávez Sánchez. Con la incorporación de los nuevos canales se estaría dando la solución integral a todos los canales de la micro cuenca Chalpa Cashapite.

IV. ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN – ADMINISTRACIÓN

El Proyecto Alto Piura es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional Piura, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con personería jurídica, con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende administrativamente, técnico y jerárquica de la Presidencia Regional.

2.1 Estructura Orgánica del Proyecto Alto Piura

A continuación se presenta el organigrama institucional:

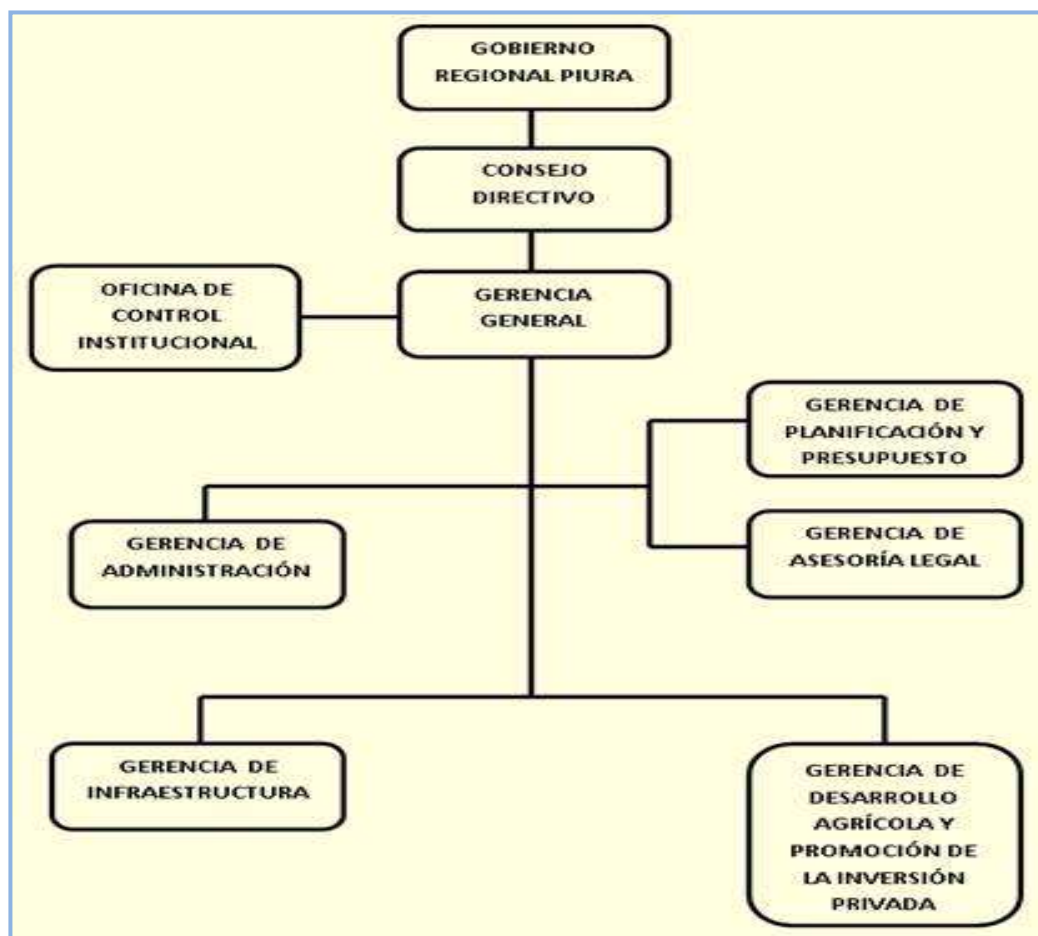


2.2 Recursos Humanos del Proyecto Alto Piura

Los recursos humanos, mejor expresados como potencial humano, constituyen en el Proyecto del Alto Piura el factor principal e indispensable para prestar servicios de calidad y lograr las metas y objetivos fijados.

El Proyecto Alto Piura, por su naturaleza temporal, suscribe con su personal contratos bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada - Decreto Legislativo N° 728.

Actualmente, el recurso humano del Proyecto Alto Piura asciende a 43 personas, de los cuales 39 trabajadores asumen funciones de acuerdo a la estructura de cargos debidamente aprobada y cinco son miembros del Directorio. Asimismo, eventualmente cuando existe la necesidad de realizar otro tipo de labores, no contempladas dentro de las funciones, según el Manual de Operaciones, se recurre a la contratación de locación de servicios, algunos de los cuales son profesionales que desarrollan tareas externas específicas y/o consultorías requeridas por el Proyecto.



De los 39 trabajadores, tenemos que 5 son directivos, 23 profesionales, 10 técnicos y 1 auxiliar. La distribución se realiza en todas las áreas orgánicas de la institución.

V IMAGEN INSTITUCIONAL

1. DIFUSIÓN

- Se elaboró y difundió nota de prensa sobre la exposición del Proyecto en reunión de jóvenes en La Matanza.
- Se elaboró y difundió nota de prensa sobre la visita de la congresista Marisol Espinoza al frente 2 del Alto Piura.
- Se elaboró y difundió nota de prensa con anuncio sobre la realización de presentación de resultados de empadronamiento en Pabur y Vicús.
- Se coordinó entrevista con el gerente general del Proyecto Alto Piura, para el programa elaborado por el Gobierno Regional que se difunde los días sábados por radio Cutivalú
- Coordinación con los encargados de las páginas web del Proyecto y de la Región Piura para la actualización correspondiente.
- Se preparó material de difusión del proyecto con la encargada del boletín elaborado por el Gobierno Regional.
- Actualización del periódico mural de la institución.
- Se coordinó con los medios de comunicación y la oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional la entrega de material informativo de acuerdo con el requerimiento de diferentes medios de comunicación o publicaciones institucionales.

2. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES

- Apoyo en la preparación y realización de la reunión de presentación de los resultados del empadronamiento de Pabur y Vicús.
- Reuniones de trabajo con CCCC y CSAP para mejorar el trabajo de presentación de difusión de bondades del I componente.
- Viaje a Pampas con fotógrafo profesional, para obtener material para la exposición del Proyecto Alto Piura.
- Viaje a Huarmaca con fotógrafo profesional, para obtener material para la exposición del Proyecto Alto Piura.

3. RELACIONES PÚBLICAS

- Se coordinó la preparación de información con las distintas gerencias para la consolidación del informe mensual del Proyecto Alto Piura y otros solicitados por las diferentes áreas del Gore, así como organismos públicos.
- Se difundió informe mensual entre principales autoridades de la región y se publicó en la página web de la institución.
- Se coordinó la preparación de la exposición fotográfica del Proyecto Alto Piura.

VI PRINCIPALES LOGROS DEL MES DE FEBRERO 2013

1.- Se logró un avance físico acumulado de la obra de 25.71%

En el frente Oriente se continúa con el ensamblaje de la Chancadora en el patio de maniobras, en el tramo Pampas – Portal de Entrada se concluyen las explanaciones, se trabaja en rellenos y obras de arte.

2.- El Consorcio Ingeniería Alto Piura hizo entrega del expediente final de los diseños definitivos del túnel trasandino.

El expediente final incluye los aportes del doctor Nick Burton, experto en túneles, el mismo que se encuentra en revisión por parte de la Gerencia de Infraestructura.

3.- Continúa la perforación del túnel trasandino

Los trabajos en la Galería, al cierre del mes de febrero tienen un avance del 38.80 m.

4.- Se concluyó con el trabajo del empadronamiento de las familias de Pabur y Vicús del distrito de La Matanza.

Con la culminación de esta actividad se conoce con exactitud el número de familias y personas que viven en los predios Pabur y Vicus, así como se tiene registrado las coordenadas de cada una de las viviendas. De otro lado también se conoce el grado de instrucción así como la ocupación de los habitantes.

Panel Fotográfico



GALERÍA DE ENTRADA DEL TÚNEL TRASANDINO



PERFORACIÓN DE LA GALERÍA DE ENTRADA DEL TÚNEL TRASANDINO



Preparación para el portal de salida



Proyecto Alto Piura presentó resultados de empadronamiento
